

LA GALANA MANAGER

Memoria del proyecto intermodular



Autor: Manuel Rodríguez Méndez

Ciclo: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

Tutor: Santiago Blanco Arenal

Tecnologías: React, Vite, Tailwind CSS, Supabase y react-calendar

Contenido

0. Presentación.....	4
0.1. Portada	4
0.2. Agradecimientos y dedicatoria	4
0.3. Índice del documento	4
0.4. Lista de imágenes	4
0.5. Lista de tablas	4
1. Estudio del problema y análisis del sistema	4
1.1. Introducción	4
1.2. Descripción de la aplicación. Motivación. Finalidad	5
1.3. Objetivos funcionales, técnicos y personales.....	5
Objetivos funcionales actualizados	5
Objetivos técnicos actualizados	6
Objetivos pendientes respecto al documento anterior.....	6
2. Recursos necesarios para el desarrollo.....	6
2.1. Recursos humanos	6
2.2. Recursos hardware	6
2.3. Recursos software	7
3. Planificación. ¿Qué se va a hacer y cuánto tiempo se prevé que necesitará?	7
3.1. Metodología para el diseño del proyecto	7
3.2. Tabla de actividades, cálculo de tiempos y diagrama de Gantt.....	7
3.3. Secuencia de desarrollo del proyecto	8
3.4. Prototipo actualizado.....	8
4. Desarrollo del proyecto. ¿Qué se ha hecho realmente y cuánto tiempo se ha necesitado?	9
4.1. Secuencia real del desarrollo del proyecto.....	9
4.1.1. Variaciones respecto al plan inicial.....	9
4.2. Diagrama relacional, diagramas de clases y lógica de la aplicación	10
Modelo relacional revisado	10
Tablas de base de datos detalladas	10
Estructura de clases/componentes actual.....	12
Lógica actual de la aplicación	13
4.3. Interacción con el usuario	13
4.3.1. Casos de uso / historias de usuario	13
Descripción textual de los casos de uso	13

4.3.2. Diseño de la interfaz	17
4.4. Código fuente	17
5. Fase de pruebas.....	17
5.1. Pruebas realizadas	17
Batería de pruebas detallada.....	17
6. Conclusiones finales.....	18
6.1. Reflexión sobre resultados obtenidos	18
6.2. Grado de cumplimiento de objetivos	18
Estado actual de la aplicación por bloques	18
6.3. Propuestas de modificación o ampliación futura.....	19
7. Dificultades y problemas fundamentales encontrados	19
8. Documentación del sistema desarrollado	19
8.1. Manual de instalación	19
8.2. Manual de uso	20
9. Bibliografía	20
10. Anexos.....	20
Anexo I. Estructura principal del proyecto.....	20
Anexo II. Variables de entorno	21
Anexo III. Verificación ejecutada	21

0. Presentación

0.1. Portada

La portada identifica el proyecto, el autor, el ciclo formativo, el tutor, la fecha de actualización y las tecnologías principales utilizadas en la aplicación.

0.2. Agradecimientos y dedicatoria

Agradezco el apoyo recibido durante el desarrollo del proyecto y el material gráfico de Casa Rural La Galana, ya que las fotografías reales han permitido construir una aplicación más fiel al alojamiento y más útil para el usuario final.

0.3. Índice del documento

Haz clic derecho y selecciona Actualizar campo para generar el índice automático.

0.4. Lista de imágenes

Nº	Imagen	Descripción
1	Portada de Casa Rural La Galana	Imagen real utilizada como presentación visual del proyecto.
2	Galería exterior	Conjunto de imágenes de fachada, patio y accesos.
3	Galería interior	Conjunto de imágenes de cocina, salón, dormitorios, baños y detalles.

0.5. Lista de tablas

Nº	Tabla	Apartado
1	Comparación entre documentación anterior y aplicación actual	1.2 / 4.1
2	Recursos necesarios	2
3	Planificación actualizada	3.2
4	Modelo de datos revisado	4.2
5	Casos de uso actualizados	4.3.1
6	Pruebas realizadas	5.1

1. Estudio del problema y análisis del sistema

1.1. Introducción

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web para Casa Rural La Galana. La documentación anterior planteaba una herramienta de gestión amplia, orientada a disponibilidad, reservas, clientes, temporadas, extras, bloqueos, exportaciones y administración. Tras revisar el código actual, la aplicación se encuentra en una fase más centrada en la web pública, la presentación visual del alojamiento, la galería, el calendario, la solicitud de reserva y la autenticación.

Esta memoria toma como base el índice oficial facilitado y actualiza el contenido anterior para que refleje el estado real del proyecto. Se diferencian claramente tres niveles: funcionalidades implementadas, funcionalidades parcialmente implementadas y funcionalidades previstas para futuras versiones.

1.2. Descripción de la aplicación. Motivación. Finalidad

La finalidad actual del sistema es ofrecer una web moderna para Casa Rural La Galana, mejorar su presencia digital y facilitar que un visitante pueda conocer la casa, ver fotografías reales, consultar disponibilidad básica, seleccionar fechas y enviar una solicitud de reserva.

A diferencia de la documentación anterior, la aplicación actual no es todavía un sistema completo de gestión interna. Sí incorpora, sin embargo, avances importantes que no estaban reflejados o estaban pendientes en el documento anterior.

Área	Lo escrito en el documento anterior	Lo existente ahora en la aplicación	Cambio aplicado en esta memoria
Web pública	Página inicial informativa y llamadas a consultar disponibilidad.	Home completa con hero visual, información, galería destacada, reserva y footer.	Se actualiza como funcionalidad implementada.
Galería	Galería prevista de imágenes.	Carrusel 3D en la home y página /galeria con exterior, interior y lightbox.	Se amplía y se documenta como novedad principal.
Cómo llegar/contacto	Mapa interactivo y contacto rápido.	Enlaces a Google Maps, teléfono y WhatsApp desde la navegación.	Se ajusta a la implementación real.
Reserva	Reserva como invitado guardada en Supabase.	Formulario visual con selección de fechas, cálculo de noches y alerta; falta inserción en BD.	Se corrige el estado: parcial, no completado.
Calendario	Disponibilidad con reservas y bloqueos.	Consulta reservas desde Supabase si está configurado y colorea estados.	Se documenta como parcial.
Autenticación	Pendiente en la versión anterior.	Login/registro con Supabase y usuarios demo locales.	Se añade como avance nuevo.
Panel administrativo	Previsto para reservas, bloqueos, temporadas y extras.	No implementado.	Se mantiene como ampliación futura.
Exportaciones	CSV/PDF previstos.	Dependencia jsPDF instalada, sin uso funcional.	Se mantiene como pendiente.

1.3. Objetivos funcionales, técnicos y personales

Objetivos funcionales actualizados

- Mostrar información clara de Casa Rural La Galana en una web responsive.

- Presentar fotografías reales mediante galería destacada y galería completa.
- Permitir seleccionar fechas en un calendario de disponibilidad.
- Permitir solicitar una reserva desde un formulario de la web.
- Facilitar contacto mediante Google Maps, llamada telefónica y WhatsApp.
- Permitir login, registro y pruebas con usuarios demo.

Objetivos técnicos actualizados

- Desarrollar la aplicación con React 19 y Vite.
- Aplicar Tailwind CSS 4 para el diseño visual y responsive.
- Usar Supabase de forma opcional y segura, evitando que la app falle si faltan variables de entorno.
- Organizar el código en componentes, páginas, datos, utilidades y cliente Supabase.
- Preparar la base para futuras funciones de administración, persistencia completa y exportación.

Objetivos pendientes respecto al documento anterior

- Guardar reservas reales en Supabase desde el formulario.
- Validar solapes de fechas y bloqueos.
- Implementar temporadas, precios y extras.
- Crear panel administrativo.
- Crear vista de mis reservas para clientes.
- Exportar confirmaciones e informes en CSV/PDF.

2. Recursos necesarios para el desarrollo

2.1. Recursos humanos

Rol	Responsabilidad
Desarrollador	Análisis, diseño, implementación, revisión del código y documentación.
Tutor/profesor	Seguimiento del proyecto, revisión y orientación.
Usuario final/propietario	Aporta necesidades reales, fotografías y validación funcional.

2.2. Recursos hardware

Recurso	Uso
Equipo de desarrollo	Programación, pruebas y generación de documentación.
Navegador moderno	Validación de la interfaz web.

Conexión a Internet	Instalación de dependencias, Supabase, Google Maps, WhatsApp y despliegue.
---------------------	--

2.3. Recursos software

Software	Uso actual
React 19.2	Construcción de componentes y páginas.
Vite 7.3	Servidor de desarrollo y build de producción.
Tailwind CSS 4.2	Diseño responsive, tema visual y estilos del calendario.
Supabase JS 2.98	Autenticación, registro y consulta de reservas si hay configuración.
react-calendar 6.0	Calendario de disponibilidad y selección de rango.
framer-motion / motion / GSAP	Dependencias disponibles para animaciones.
jsPDF	Dependencia instalada para futuras exportaciones PDF.
Git	Control de versiones.

3. Planificación. ¿Qué se va a hacer y cuánto tiempo se prevé que necesitará?

3.1. Metodología para el diseño del proyecto

La metodología seguida es incremental. El documento anterior definía un alcance amplio de gestión completa; en la práctica se ha priorizado primero una versión pública usable y visual, dejando la gestión avanzada para iteraciones posteriores. Esta decisión permite entregar una aplicación visible y funcional antes de completar todo el módulo administrativo.

3.2. Tabla de actividades, cálculo de tiempos y diagrama de Gantt

Duración total estimada del plan inicial: 136 horas. En la versión actual se mantiene esta estimación como referencia, aunque varias tareas se han redistribuido: la parte visual, la galería y el login han avanzado más, mientras que el panel administrativo, las exportaciones, los extras y los bloqueos siguen pendientes.

Figura. Diagrama de Gantt actualizado.



Fase	Plan inicial	Estado actual	Observación
Fase 1	Análisis, React, Supabase, casos de uso y modelo de datos.	Realizada	Se mantiene la base de análisis.
Fase 2	Creación del proyecto, maquetación pública y conexión Supabase.	Realizada	La web pública está desarrollada y Supabase queda opcional.
Fase 3	Disponibilidad, reserva, precios, calendario y bloqueos.	Parcial	Calendario y selección de fechas existen; precios, bloqueos y guardado quedan pendientes.
Fase 4	Autenticación, roles, mis reservas, panel admin, temporadas y extras.	Parcial	Autenticación y roles básicos existen; panel, mis reservas, temporadas y extras no.
Fase 5	CSV/PDF, métricas, APIs externas, despliegue y documentación.	Parcial	Documentación actualizada y build verificado; exportaciones y métricas pendientes.

3.3. Secuencia de desarrollo del proyecto

3.4. Prototipo actualizado

El PDF anterior describía el prototipo previsto. En esta segunda parte de la documentación se actualiza el prototipo según lo que ya existe en la aplicación:

- Página de inicio con información de La Galana, imagen principal y llamada a reservar.
- Galería destacada en la home mediante carrusel 3D.
- Página de galería completa con imágenes exteriores e interiores y visor ampliado.
- Sección de reserva con calendario visual y formulario de solicitud.
- Accesos directos a Google Maps, llamada telefónica y WhatsApp.
- Página de login y registro con Supabase y usuarios demo.

Siguen pendientes dentro del prototipo completo: panel administrativo, gestión de temporadas, extras, bloqueos, exportaciones y vista de mis reservas.

1. Creación del proyecto React/Vite.
2. Configuración de Tailwind CSS y tema visual.
3. Implementación de home con Hero, Info, Gallery, Reserva y Footer.
4. Incorporación de fotografías reales y estructuras de datos de imágenes.
5. Desarrollo de galería completa en la ruta /galeria.
6. Implementación de calendario con react-calendar y lectura opcional desde Supabase.
7. Implementación de formulario de reserva visual con selección de rango y cálculo de noches.
8. Implementación de login/registro con Supabase y usuarios demo locales.
9. Revisión de diferencias frente al documento anterior y actualización de la memoria.

4. Desarrollo del proyecto. ¿Qué se ha hecho realmente y cuánto tiempo se ha necesitado?

4.1. Secuencia real del desarrollo del proyecto

4.1.1. Variaciones respecto al plan inicial

La comparación con el PDF anterior muestra estas variaciones principales:

- La galería completa y el carrusel 3D han avanzado más de lo previsto inicialmente.
- La autenticación ya existe, aunque en el PDF anterior aparecía como pendiente.
- La reserva como invitado existe a nivel de interfaz, pero no almacena todavía la reserva real en Supabase.
- La gestión de extras y temporadas se mantiene simplificada y pendiente.
- La validación de solapes y bloqueos sigue pendiente.

- Las exportaciones CSV/PDF se posponen para una fase posterior.
- La aplicación no tiene todavía panel administrativo ni rol empleado funcional.

La secuencia real se ha desviado del plan inicial. En vez de completar primero toda la gestión interna, se ha avanzado especialmente en la interfaz pública, la experiencia visual, la galería, el calendario y la autenticación.

Bloque desarrollado	Qué estaba escrito antes	Qué se ha hecho ahora
Interfaz pública	Página principal con información.	Home completa con imagen principal, CTA de reserva, datos de la casa, galería destacada y footer.
Galería	Galería prevista.	Galería completa con 35 imágenes aproximadas, secciones exterior/interior, lightbox y navegación por teclado.
Calendario	Disponibilidad con reservas y bloqueos.	Consulta de reservas Supabase por mes activo y estados disponible, pendiente y confirmada.
Reserva	Reserva persistida como invitado.	Formulario visual y cálculo de noches; falta persistencia real.
Autenticación	Pendiente.	Login, registro, logout y usuarios demo locales.
Navegación	Header/footer básicos.	Navegación con rutas /, /galeria, /login, enlaces a maps, teléfono y WhatsApp.

4.2. Diagrama relacional, diagramas de clases y lógica de la aplicación

Modelo relacional revisado

Tablas de base de datos detalladas

Se conservan las tablas previstas en el PDF anterior, pero se actualiza su estado según la aplicación actual.

Cientes

Campo	Tipo	Descripción	Estado actual
id	serial PK	Identificador único del cliente.	Previsto
nombre	text	Nombre completo del cliente.	Los datos se recogen en formulario, pero no se guardan todavía.
email	text UNIQUE	Correo electrónico del cliente.	Se usa en login y formulario.
telefono	text	Número de teléfono.	Se recoge en el formulario de reserva.


Reservas

Campo	Tipo	Descripción	Estado actual
id	serial PK	Identificador único de la reserva.	Previsto/BD
cliente_id	int FK	Cliente asociado a la reserva.	Pendiente de asociar desde el formulario.
fecha_inicio	date	Fecha de inicio de la reserva.	Se consulta desde el calendario.
fecha_fin	date	Fecha de fin de la reserva.	Se consulta desde el calendario.
estado	text	pendiente, confirmada o cancelada.	Se usa para pintar el calendario.
total	numeric(10,2)	Total calculado.	Pendiente porque no hay precios/extras.
creado_en	timestamp	Fecha de creación.	Previsto.

Reserva_extras

Campo	Tipo	Descripción	Estado actual
reserva_id	int FK	Reserva a la que pertenece el extra.	Pendiente
nombre_extra	text	Nombre del extra.	Pendiente
precio	numeric(10,2)	Precio del extra.	Pendiente
cantidad	int	Cantidad del extra.	Pendiente

Figura. Diagrama relacional actual / previsto.

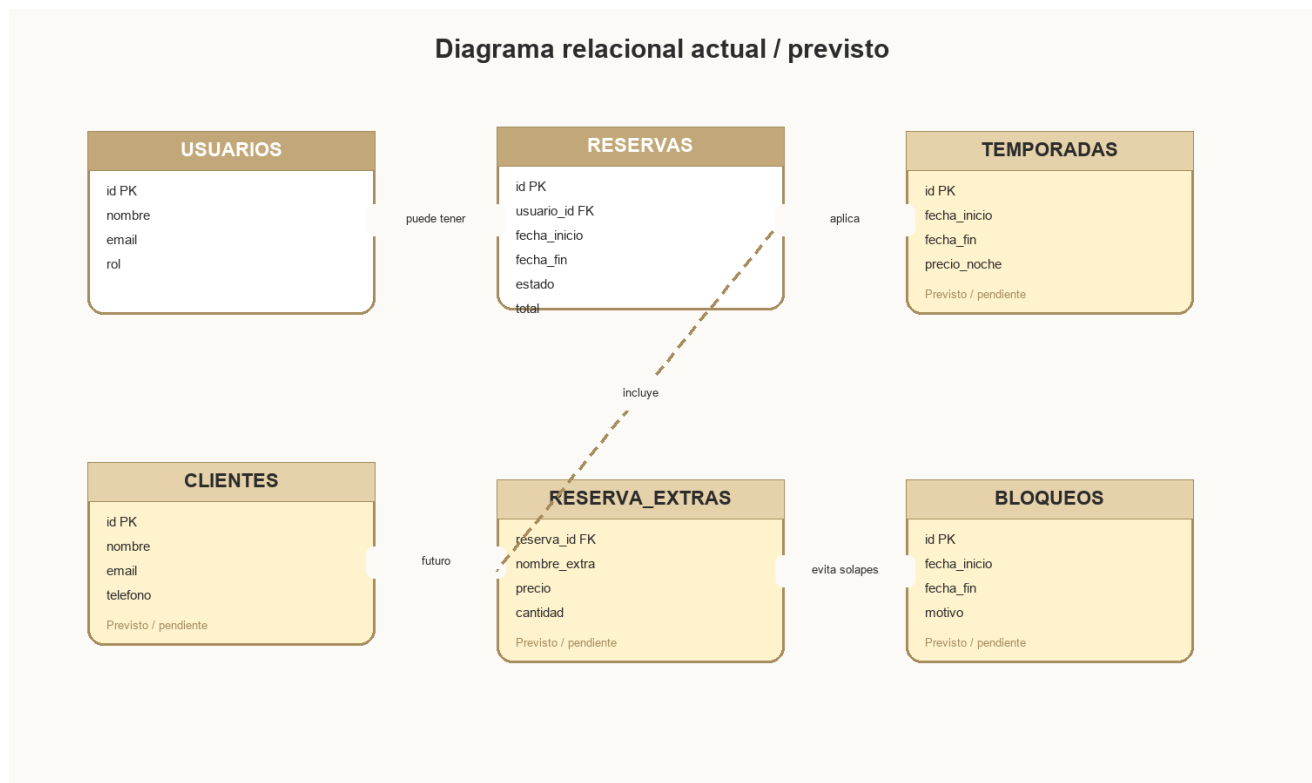


Entidad	Estado en el documento anterior	Estado en el código actual
usuarios	No era el centro del modelo	Se usa para guardar perfiles de

	inicial.	registro y consultar rol.
reservas	Tabla principal de reservas con estado y total.	Se consulta para disponibilidad, pero no se insertan reservas desde el formulario.
clientes	Tabla prevista.	Los datos del formulario no se guardan todavía como cliente.
reserva_extras	Tabla prevista.	Pendiente.
temporadas	Entidad prevista para tarifas.	Pendiente.
bloqueos	Entidad prevista para mantenimiento o uso privado.	Pendiente.

Estructura de clases/componentes actual

Figura. Diagrama de clases / componentes con nombres reales en español.

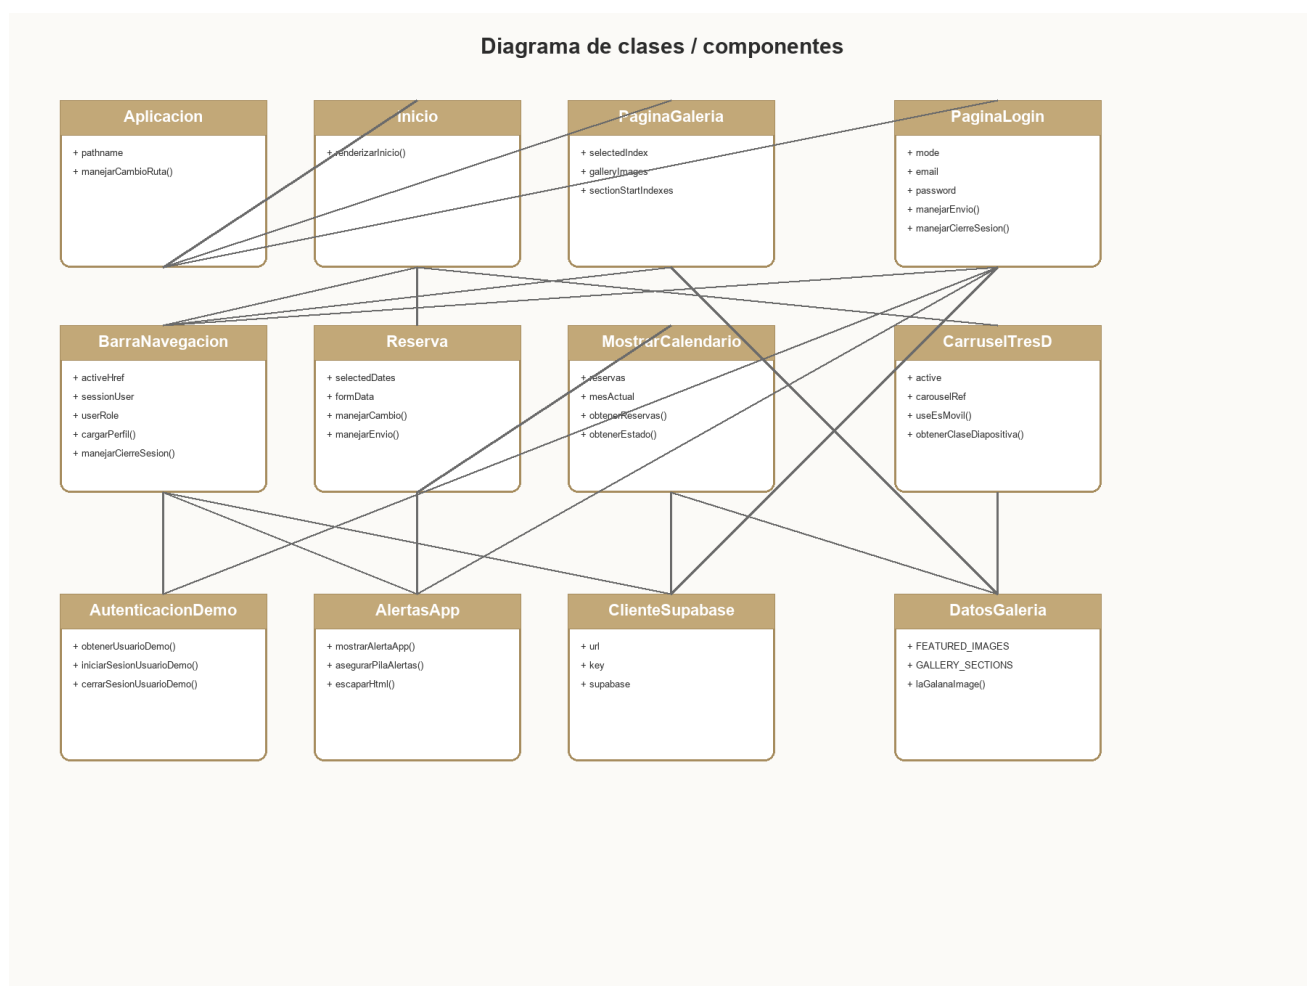

Fichero	Responsabilidad
src/App.jsx	Control de vistas según pathname: /, /galeria y /login.
src/pages/Home.jsx	Composición de la página principal.
src/pages/GalleryPage.jsx	Galería completa, secciones, lightbox y navegación.
src/pages/LoginPage.jsx	Login, registro, cierre de sesión y usuarios demo.

src/components/NavBar.jsx	Navegación, sesión activa, rol y logout.
src/components/Calendar.jsx	Calendario, lectura de reservas y clases de estado.
src/components/Reserva.jsx	Formulario, selección de fechas y cálculo de noches.
src/components/ThreeDCarousel.jsx	Carrusel interactivo con rotación y controles.
src/data/laGalanaImages.js	Rutas de imágenes reales y listas de exterior/interior.
src/supabase/client.js	Cliente Supabase opcional según variables de entorno.
src/utils/demoAuth.js	Gestión de usuarios demo en localStorage.

Lógica actual de la aplicación

- La navegación se controla con pathname y un evento personalizado app:navigate.
- El calendario consulta reservas de Supabase si existen VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY.
- Cada día del calendario se pinta como disponible, pendiente o confirmada.
- El formulario de reserva valida que haya fechas de entrada y salida, calcula noches y muestra alerta.
- El login usa Supabase si está configurado y fallback demo local si no lo está.

4.3. Interacción con el usuario

4.3.1. Casos de uso

Descripción textual de los casos de uso

Además de los diagramas, se describen los casos de uso heredados del PDF anterior y se actualiza su estado:

Caso de uso	Descripción	Estado en la aplicación actual
Consultar disponibilidad	El usuario revisa el calendario para ver fechas disponibles u ocupadas.	Parcialmente implementado. Depende de reservas en Supabase.
Reservar como invitado	El usuario introduce datos personales y selecciona fechas.	Interfaz implementada; falta guardar la reserva en Supabase.
Registro/Login de cliente	El usuario crea cuenta o inicia sesión.	Implementado con Supabase y usuarios demo.
Administrar reservas	Crear, editar o cancelar reservas.	Pendiente. No hay panel administrativo.
Gestionar temporadas y extras	Configurar precios y servicios adicionales.	Pendiente.
Exportaciones	Generar CSV y PDF.	Pendiente.
Empleado	Gestionar reservas y bloqueos operativos.	Actor previsto, pendiente de implementación.

Figura. Casos de uso del Visitante.

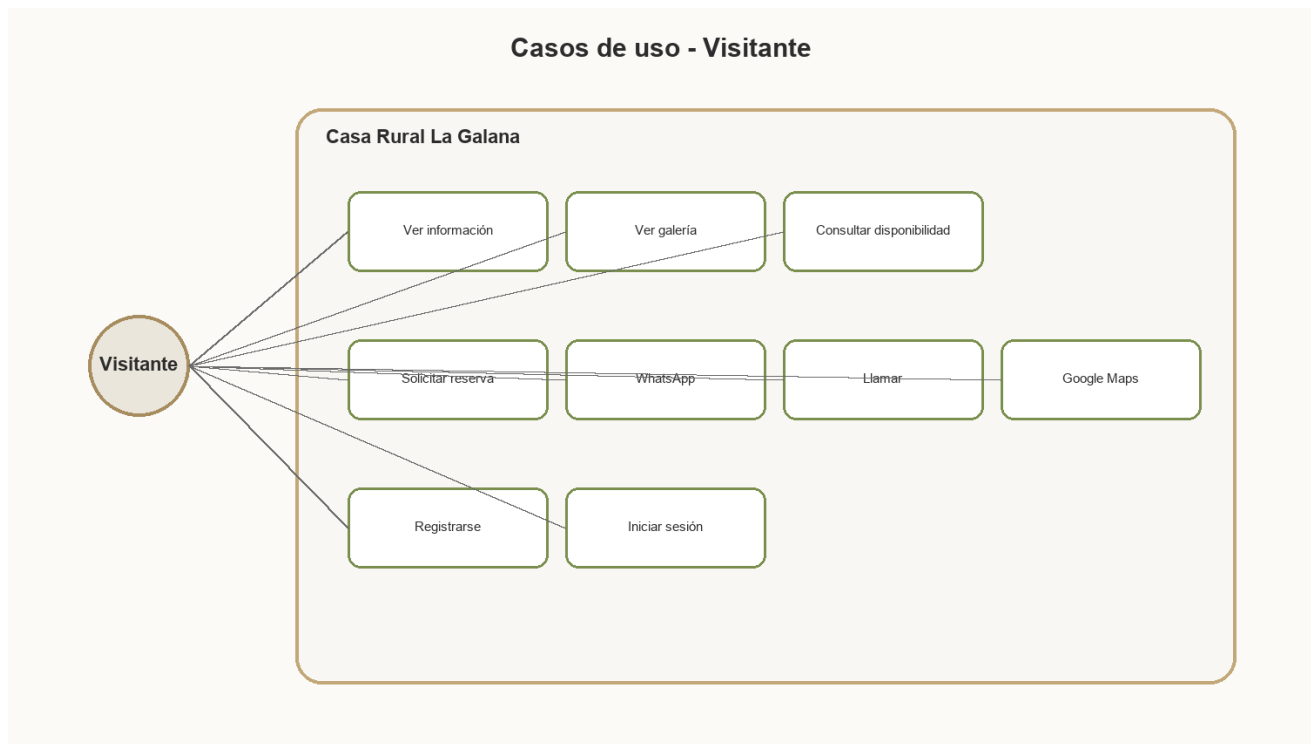


Figura. Casos de uso del Cliente.

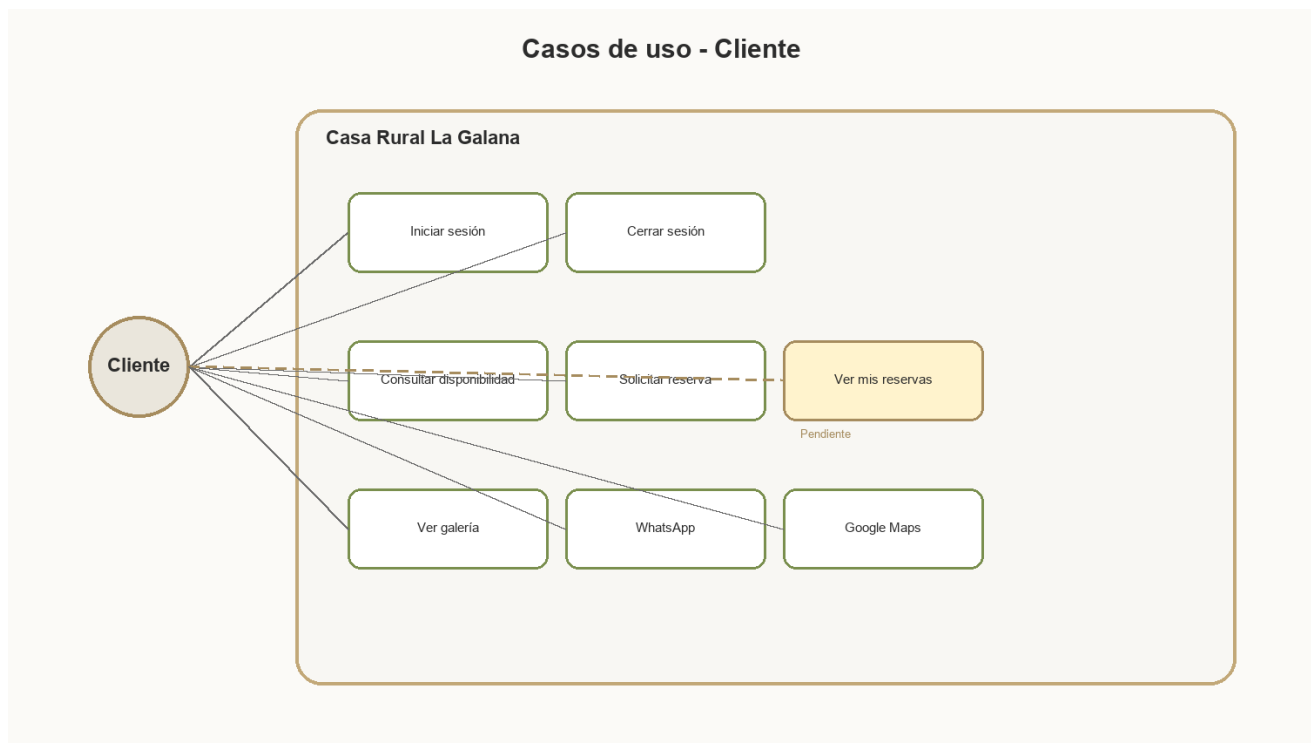


Figura. Casos de uso del Administrador.

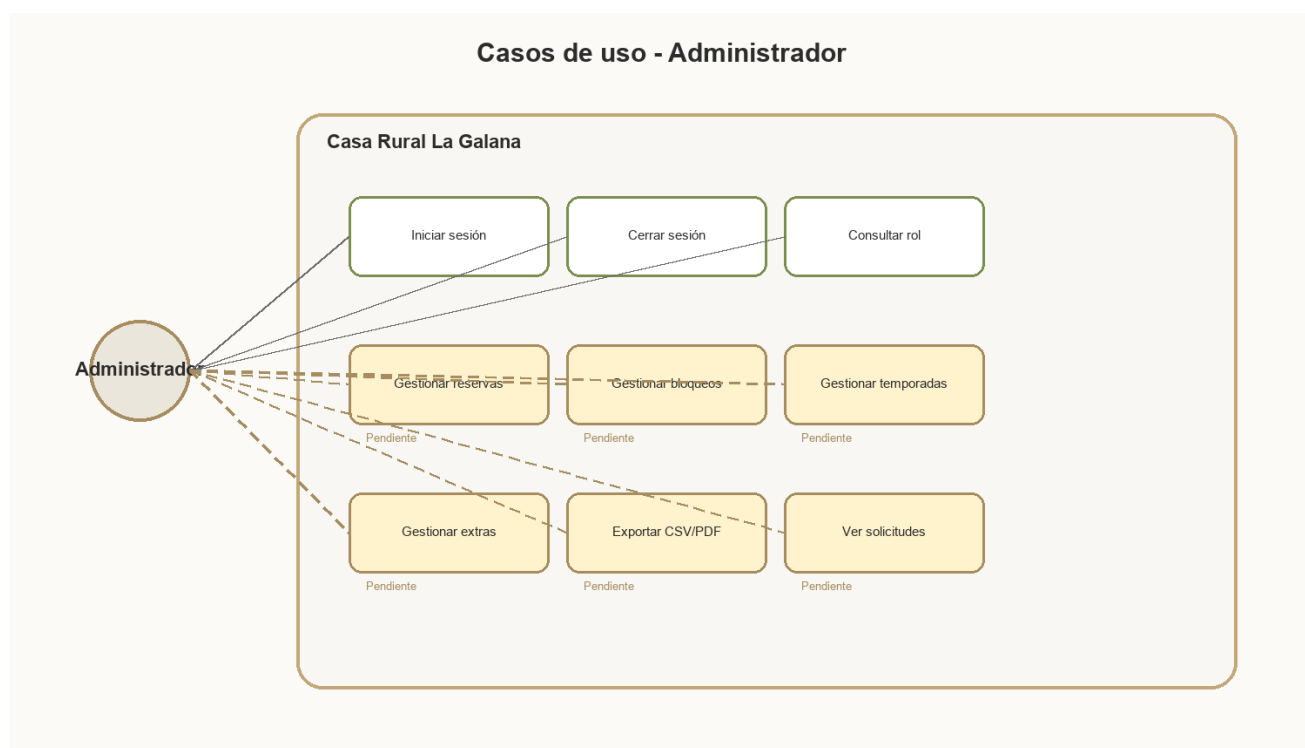


Figura. Casos de uso del Empleado.


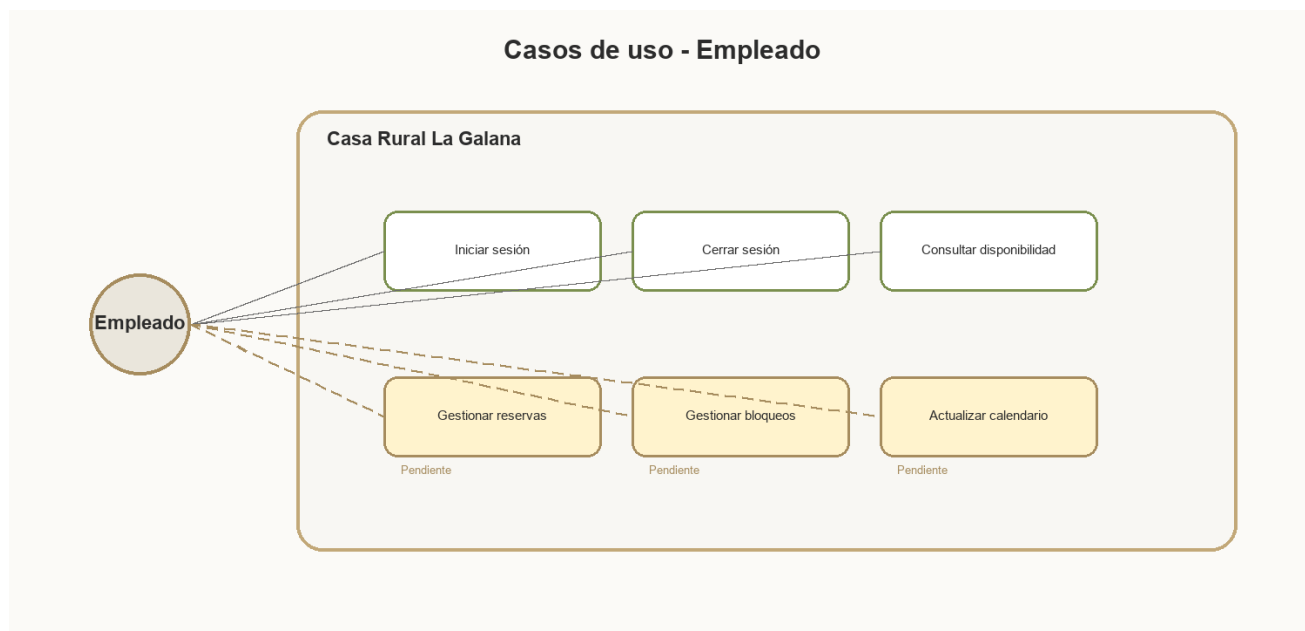


Figura. Diagrama de flujo de reserva actual.

Flujo de reserva actual

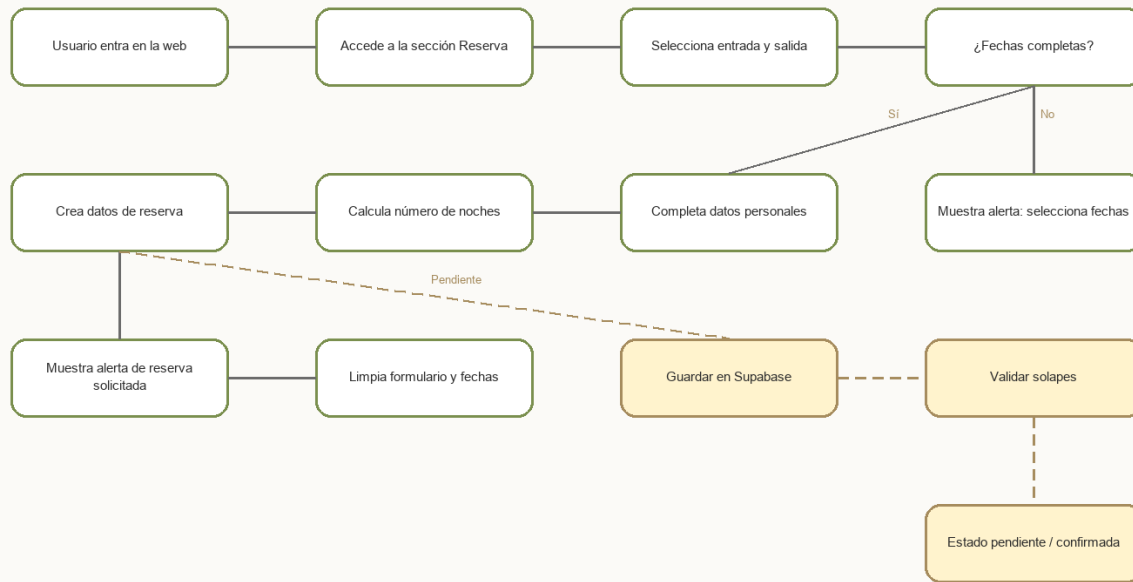

Caso de uso	Estado actual	Descripción
Consultar información de la casa	Implementado	El usuario accede a la home y consulta capacidad y características.
Ver galería completa	Implementado	El usuario accede a /galería, revisa imágenes y usa lightbox.
Consultar disponibilidad	Parcial	El usuario ve calendario; los estados dependen de datos en Supabase.
Solicitar reserva	Parcial	El usuario selecciona fechas y completa datos; falta guardar en BD.
Registrarse	Implementado con Supabase	Crea cuenta y perfil con rol cliente si hay configuración.
Iniciar sesión	Implementado	Acceso con Supabase o usuarios demo locales.
Administrar reservas	Pendiente	No existe panel administrativo todavía.
Exportar informes	Pendiente	No hay CSV/PDF funcional.

4.3.2. Diseño de la interfaz

La interfaz actual utiliza una estética cálida y rural. Se combinan tonos beige, verde y gris oscuro con fotografías reales. La fuente Playfair Display se usa para títulos y la fuente Inter para contenido. La web está pensada para uso responsive y prioriza la imagen del alojamiento.

4.4. Código fuente

Inicialización segura de Supabase:

```
const url = import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL;  
const key = import.meta.env.VITE_SUPABASE_ANON_KEY;  
export const supabase = url && key ? createClient(url, key) : null;
```

Consulta de reservas del calendario:

```
const { data, error } = await supabase  
  .from("reservas")  
  .select("*")  
  .lte("fecha_inicio", formatearFecha(ultimoDia))  
  .gte("fecha_fin", formatearFecha(primerDia));
```

Usuarios demo disponibles:

```
admin@lagalana.com / admin123  
cliente@lagalana.com / cliente123
```

5. Fase de pruebas

5.1. Pruebas realizadas

Batería de pruebas detallada

Caso de prueba	Objetivo	Datos de entrada	Pasos a seguir	Resultado esperado
Consulta disponibilidad	Verificar calendario	Mes cualquiera	1. Entrar en Reserva. 2. Cambiar de mes. 3. Observar colores.	Se muestran fechas disponibles, pendientes o confirmadas si hay datos.
Selección de rango	Validar selección de entrada y salida	Dos fechas	1. Seleccionar inicio. 2. Seleccionar fin.	Se muestra el rango seleccionado y número de noches.
Reserva sin fechas	Comprobar validación	Formulario sin rango completo	1. Rellenar datos. 2. Enviar sin fechas.	Aparece alerta solicitando seleccionar fechas.
Solicitud de reserva	Comprobar flujo visual	Nombre, email, teléfono y fechas	1. Rellenar formulario. 2. Enviar.	Aparece alerta de reserva solicitada y se limpia el

				formulario.
Login demo	Validar acceso sin Supabase	admin@lagalana.com/admin123	1. Entrar en Login. 2. Introducir credenciales demo.	Se inicia sesión demo y se actualiza la navegación.
Registro Supabase	Validar registro real	Nombre, email y contraseña	1. Configurar Supabase. 2. Crear cuenta.	Se crea usuario y perfil con rol cliente.
Navegación	Verificar rutas principales	Usuario en la app	1. Ir a Inicio. 2. Ir a Galería. 3. Ir a Login.	Todas las vistas cargan sin errores.

No se han localizado pruebas automatizadas. Para la entrega final se recomienda añadir pruebas de componentes y pruebas específicas para validación de solapes, guardado de reservas y flujos con Supabase.

6. Conclusiones finales

6.1. Reflexión sobre resultados obtenidos

El proyecto ha avanzado de forma clara en la parte visual y pública. La aplicación actual ya permite presentar Casa Rural La Galana de manera profesional, mostrar imágenes reales, navegar por secciones principales, acceder a una galería completa, seleccionar fechas y probar autenticación.

6.2. Grado de cumplimiento de objetivos

Estado actual de la aplicación por bloques

Bloque	Estado	Detalle
Página principal	Implementado	Home con portada, información, galería destacada, reserva y footer.
Galería completa	Implementado	Secciones exterior/interior y lightbox.
Calendario	Parcial	Lee reservas si Supabase está configurado.
Reserva	Parcial	Formulario y cálculo de noches; falta inserción en BD.
Autenticación	Implementado/parcial	Login, registro y demo local. Falta zona de cliente completa.
Base de datos	Parcial	Usuarios y reservas se contemplan; clientes/extras/temporadas/bloqueos pendientes.
Panel administrativo	Pendiente	No implementado.
Exportaciones	Pendiente	No implementado.
Objetivo	Grado de cumplimiento	Comentario
Web pública	Alto	Implementada y responsive.
Galería	Alto	Muy ampliada respecto al documento anterior.
Calendario	Medio	Funcional con Supabase, pero sin bloqueos completos.

Reserva	Medio-bajo	Interfaz hecha, persistencia pendiente.
Autenticación	Medio-alto	Supabase y demo local implementados.
Panel administrativo	No cumplido	Pendiente.
Exportaciones	No cumplido	Pendiente.

6.3. Propuestas de modificación o ampliación futura

- Guardar reservas reales en Supabase desde Reserva.jsx.
- Validar solapes antes de aceptar nuevas solicitudes.
- Crear vista de mis reservas para clientes.
- Crear panel administrativo para confirmar, cancelar y bloquear fechas.
- Añadir temporadas, precios y extras.
- Implementar exportaciones CSV/PDF.
- Añadir pruebas automatizadas.
- Preparar despliegue final con variables de entorno seguras.

7. Dificultades y problemas fundamentales encontrados

- El alcance inicial era mayor que el estado real de la aplicación, por lo que ha sido necesario corregir la documentación.
- Supabase debe tratarse como opcional para evitar errores si faltan variables de entorno.
- La persistencia real de reservas todavía requiere definir el flujo completo de clientes y reservas.
- La validación de solapes y bloqueos es una de las partes más delicadas del sistema.
- La galería contiene muchas imágenes y requiere una estructura clara para mantener el rendimiento y la usabilidad.

8. Documentación del sistema desarrollado

8.1. Manual de instalación

1. Abrir una terminal en C:\Users\Manuel\Desktop\Proyecto\ProyectoIntermodular.
2. Ejecutar npm install si no están instaladas las dependencias.
3. Crear opcionalmente un archivo .env con VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY.
4. Ejecutar npm run dev para desarrollo.

5. Ejecutar npm run build para producción.

8.2. Manual de uso

1. Entrar en la página principal para ver la presentación de La Galana.
2. Usar el menú para ir a Reserva, Galería, Info, Cómo llegar, Llamar o WhatsApp.
3. En Galería, abrir imágenes y navegar por el visor.
4. En Reserva, seleccionar entrada y salida y completar los datos.
5. En Login, iniciar sesión con Supabase o usar usuarios demo.

9. Bibliografía

- React: <https://react.dev/>
- Vite: <https://vite.dev/>
- Tailwind CSS: <https://tailwindcss.com/>
- Supabase: <https://supabase.com/docs>
- react-calendar: <https://github.com/wojtekmaj/react-calendar>
- jsPDF: <https://github.com/parallax/jsPDF>
- Documentación anterior del proyecto: Documentacion-1.docx
- Índice oficial de memoria: indice proyecto.pdf

10. Anexos

Anexo I. Estructura principal del proyecto

```
src/  
  App.jsx  
  main.jsx  
  components/  
    Calendar.jsx  
    Gallery.jsx  
    Hero.jsx  
    Info.jsx  
    NavBar.jsx  
    Reserva.jsx  
    ScrollReveal.jsx  
    ThreeDCarousel.jsx  
  data/  
    galleryImages.js  
    laGalanaImages.js  
  pages/  
    GalleryPage.jsx  
    Home.jsx
```

```
LoginPage.jsx  
supabase/  
  client.js  
utils/  
  appAlert.js  
  demoAuth.js
```

Anexo II. Variables de entorno

```
VITE_SUPABASE_URL=URL_DEL_PROYECTO  
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=CLAVE_PUBLICA_ANON
```

Anexo III. Verificación ejecutada

```
npm run build  
Resultado: compilación correcta con Vite.
```
